



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА



Применение типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов



Методические указания по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым, от 22 марта 2019 года № 2523п-П6

Март 2019

Типы результатов – инструмент для упрощения планирования и мониторинга хода реализации



ЦЕЛИ

- **Упрощение** процесса **подготовки** органами власти федеральных и региональных проектов, **планов мероприятий** по реализации проектов, а также внесения в них изменений
- **Повышение качества и глубины** планирования и последующего мониторинга федеральных и региональных проектов
- **Упрощение** анализа хода реализации проекта путем консолидации в одном документе (план мероприятий) основных управленческих инструментов

Ключевые понятия:

1 Тип результата -

обобщённый результат, не содержащий специфики проекта, имеющий свой жизненный цикл

2 Стандартизированные контрольные точки –

контрольные точки, необходимые для достижения определенного типа результата с учетом условий организации работ



Необходимо
НЕ МЕНЕЕ

4

контрольных точек
в год на 1 результат

Для своевременного принятия решений в случае рисков достижения результатов



пп. "м" п.3. раздела 1 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

Перечень типов результатов

В ходе анализа паспортов федеральных проектов проведена работа по выделению типов результатов

Типы результатов

- | | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | 7 | Проведение массовых мероприятий | 12 | Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии |
| 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | 8 | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | 13 | Создание Российской промышленной зоны за рубежом |
| 3 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | 9 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | 14 | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 4 | Проведение образовательных мероприятий | 10 | Проведение информационно-коммуникационной кампании | 15 | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |
| 5 | Принятие нормативного правового (правового) акта | 11 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | |
| 6 | Утверждение документа | | | | |

В соответствии с жизненным циклом достижения результата применяются специальные контрольные точки

Для всех типов результатов в зависимости от условий организации работ (видов расходов) применяются обеспечивающие контрольные точки

- | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Закупка товаров, работ, услуг
<i>(группа видов расходов 200, вид расходов 323, подгруппы 410 и 880)</i> | 2 | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
<i>(группа видов расходов 500)</i> | 3 | Предоставление субсидий на выполнение государственного задания бюджетным и автономным учреждениям
<i>(виды расходов 611, 621)</i> | 4 | Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
<i>(группа видов расходов 600 (кроме 611,621), подгруппы 450, 460, 810, 820)</i> |
|---|--|---|---|---|--|---|--|

Типы результатов и стандартизированные контрольные точки

п.3. раздела 1 Методических указаний
применению типов результатов и
стандартизированных контрольных точек
федеральных проектов

Изменение типа
результата допускается
в случае:

- Если не наступил срок начала реализации специальных контрольных точек у всех участников федерального проекта
- Особых обстоятельств, согласованных с проектным офисом Правительства РФ, Минфином России и одобренных соответствующим Проектным комитетом

Стандартизированные контрольные точки

Обязательные контрольные точки

1 Специальные контрольные точки

контрольные точки, характеризующие жизненный цикл достижения **результата**

СКТ

2 Обеспечивающие контрольные точки

контрольные точки, соответствующие **условиям организации работ** (видам расходов)

ОКТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ –

Могут применяться в дополнение к специальным и обеспечивающим контрольным точкам по решению руководителя проекта

ДКТ

Перечень специальных контрольных точек



Приложение №2 к Методическим указаниям по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

Раздел 1.

Выбор типа результата

Перечень стандартизированных контрольных точек

№ п/п	Наименование типа результата, стандартизированной контрольной точки	Примечание
1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества		
1.	Земельный участок предоставлен заказчику	применяется только для вида работ "строительство"
2.	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	применяется только для видов работ "строительство", "реконструкция"; выделяется экспертиза проектной документации, историко-культурная экспертиза, экологическая экспертиза, экспертиза достоверности сметной стоимости
3.	Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	применяется только для видов работ "строительство", "реконструкция"
4.	Строительно-монтажные работы завершены	применяется только для видов работ "строительство", "реконструкция"
5.	Оборудование приобретено	не применяется для вида работ "приобретение"
6.	Оборудование установлено	не применяется для вида работ "приобретение"
7.	Оборудование введено в эксплуатацию	не применяется для вида работ "приобретение"

Указание особенностей применения

обязательность применения для определённого вида работ из типа результата

Перечень обеспечивающих контрольных точек по условиям организации работ (видам расходов)



Приложение №2 к Методическим указаниям по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

№ п/п	Наименование стандартизированной контрольной точки	Примечание
1. Закупка товаров, работ, услуг		
1.	Закупка включена в план закупок	Используется в случае, если бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов предусмотрены по группе видов расходов 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", и (или) виду расходов 323 "Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения", и (или) подгруппе видов расходов 410 "Бюджетные инвестиции" бюджетной классификации Российской Федерации, и (или) подгруппе 880 видов расходов "Специальные расходы"
2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	
3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	
4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	
2. Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		
1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	Используется в случае, если бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов предусмотрены по группе видов расходов 500 "Межбюджетные трансферты" бюджетной классификации Российской Федерации
2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	
3.	С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	
4.	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	

Раздел 2.

Выбор условий организации работ

Перечень стандартизированных контрольных точек

Указание особенностей применения

обязательность применения в случае если бюджетные ассигнования предусмотрены по указанным видам расходов

Принципы применения типов результатов и стандартизированных контрольных точек (1/2)



п.2. раздела 1 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

✓ Тип результата указывается по каждому результату проекта, утвержденному в паспорте соответствующего проекта (пп. "а" п.2)

Пример контрольных точек для результата, соответствующего типу «Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Построена детская больница					
СКТ	1.1. Земельный участок предоставлен заказчику					
СКТ	1.2. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз					
ДКТ	1.3. Утверждена рабочая документация					
СКТ	1.4. Получено разрешение на строительство (реконструкцию)					
СКТ	1.5. Строительно-монтажные работы завершены					
СКТ	1.6. Техническая готовность объекта, % (детской больницы, 50%)					
СКТ	1.7. Техническая готовность объекта, % (детской больницы, 100%)					
СКТ	1.8. Оборудование приобретено					
СКТ	1.9. Оборудование установлено					
СКТ	1.10. Оборудование введено в эксплуатацию					
СКТ	1.11. Заключение органа государственного строительного надзора получено					
СКТ	1.12. Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (детская больница)					
СКТ	1.13. Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена (детская больница)					

1 (пп. "в" п.2) Если контрольные точки **не требуются** для достижения результата, приводятся соответствующие **комментарии**

Контрольной точке устанавливается признак «Не требуется», указывается комментарий о неактуальности/не применимости в данном проекте

Не требуется

2 (пп. "в" п.2) **Выполненные** контрольные точки в момент формирования паспорта **включаются** в план мероприятий с указанием даты и подтверждением их выполнения

Контрольной точке устанавливается признак "Выполнено", указывается дата и подтверждение выполнения

Выполнено

3 (пп. "з" п.2) Добавление при необходимости **дополнительных** контрольных точек (кроме специальных и обеспечивающих)

4 (пп. "е" п.2) Дублирование специальных контрольных точек в рамках одного результата проекта в случае необходимости **выделения этапов** реализации результата

5 (пп. "л" п.2) Указание в контрольной точке **дополнительной** отраслевой или иной **содержательной информации** (без изменения формулировки стандартизированной контрольной точки)

Принципы применения типов результатов и стандартизированных контрольных точек (2/2)

✓ По каждому типу результата используются контрольные точки, соответствующие типу результата (специальные контрольные точки) и контрольные точки, соответствующие условиям организации работ (виду расходов) (обеспечивающие контрольные точки) (пп. "б", п.2)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Построено/реконструировано 7 детских больниц					
ОКТ	1.1. Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (7 субъектам Российской Федерации на строительство/реконструкцию 7 детских больниц)					
ОКТ	1.2. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (7 субъектам Российской Федерации на строительство/реконструкцию 7 детских больниц)					
ОКТ	1.3. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (7 субъектам Российской Федерации на строительство/реконструкцию 7 детских больниц)					
СКТ	1.4. Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (в 7 субъектах Российской Федерации на строительство/реконструкцию 7 детских больниц)					
ДКТ	1.5. Утверждена рабочая документация					
СКТ	1.6. Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (строительство 3 детских больниц в 3 субъектах Российской Федерации в 2019 году)					
СКТ	1.7. Получено разрешение на строительство (реконструкцию) (строительство 4 детских больниц в 4 субъектах Российской Федерации в 2020 году)					
	1.8. ...					

6 Установление по обеспечивающим контрольным точкам **количественных значений** (при наличии) и **сроков** их реализации
(пп. "з" п.2)

Обеспечивающие контрольные точки, соответствующие группе вида расходов 500 "Межбюджетные трансферты"

7 Возможность установления по специальным контрольным точкам **количественных значений** и **сроков** их реализации, не превышающих значения и **сроки реализации результата** проекта
(пп. "у" п.2)

8 По результатам проектов, достижение которых планируется **в течение нескольких лет**, указываются контрольные точки с **количественным значением результата** в текущем и очередном году
(пп. "к" п.2)

9 В рабочем плане проекта стандартизированные контрольные точки по результатам проектов **должны быть декомпозированы** по публично-правовым образованиям и организациям, обеспечивающим реализацию результата
(пп. "д" п.2)

10 В рабочем плане проекта стандартизированные контрольные точки по результатам проектов **должны быть декомпозированы** до конечных объектов (единицы результата)
(пп. "ж" п.2)

Каскадирование на уровень регионального проекта



пп. "в" и "г" п.2. раздела 1 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

В «План мероприятий» регионального проекта по соответствующим результатам обязательно включаются специальные и обеспечивающие контрольные точки, а также при необходимости дополнительные контрольные точки из «Плана мероприятий» федерального проекта

Формирование «Плана мероприятий» не требует внесение изменений в соглашения с субъектами – дорабатывается только «План мероприятий» регионального проекта




Порядок внесения изменений в перечень типов результатов и стандартизированных контрольных точек



Раздел 2 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

Проектный офис Правительства Российской Федерации осуществляет сбор и консолидацию предложений и обеспечивает внесение изменений в перечень типов результатов и стандартизированных контрольных точек не реже одного раза в год в целях ежегодной актуализации и планирования национальных и федеральных проектов

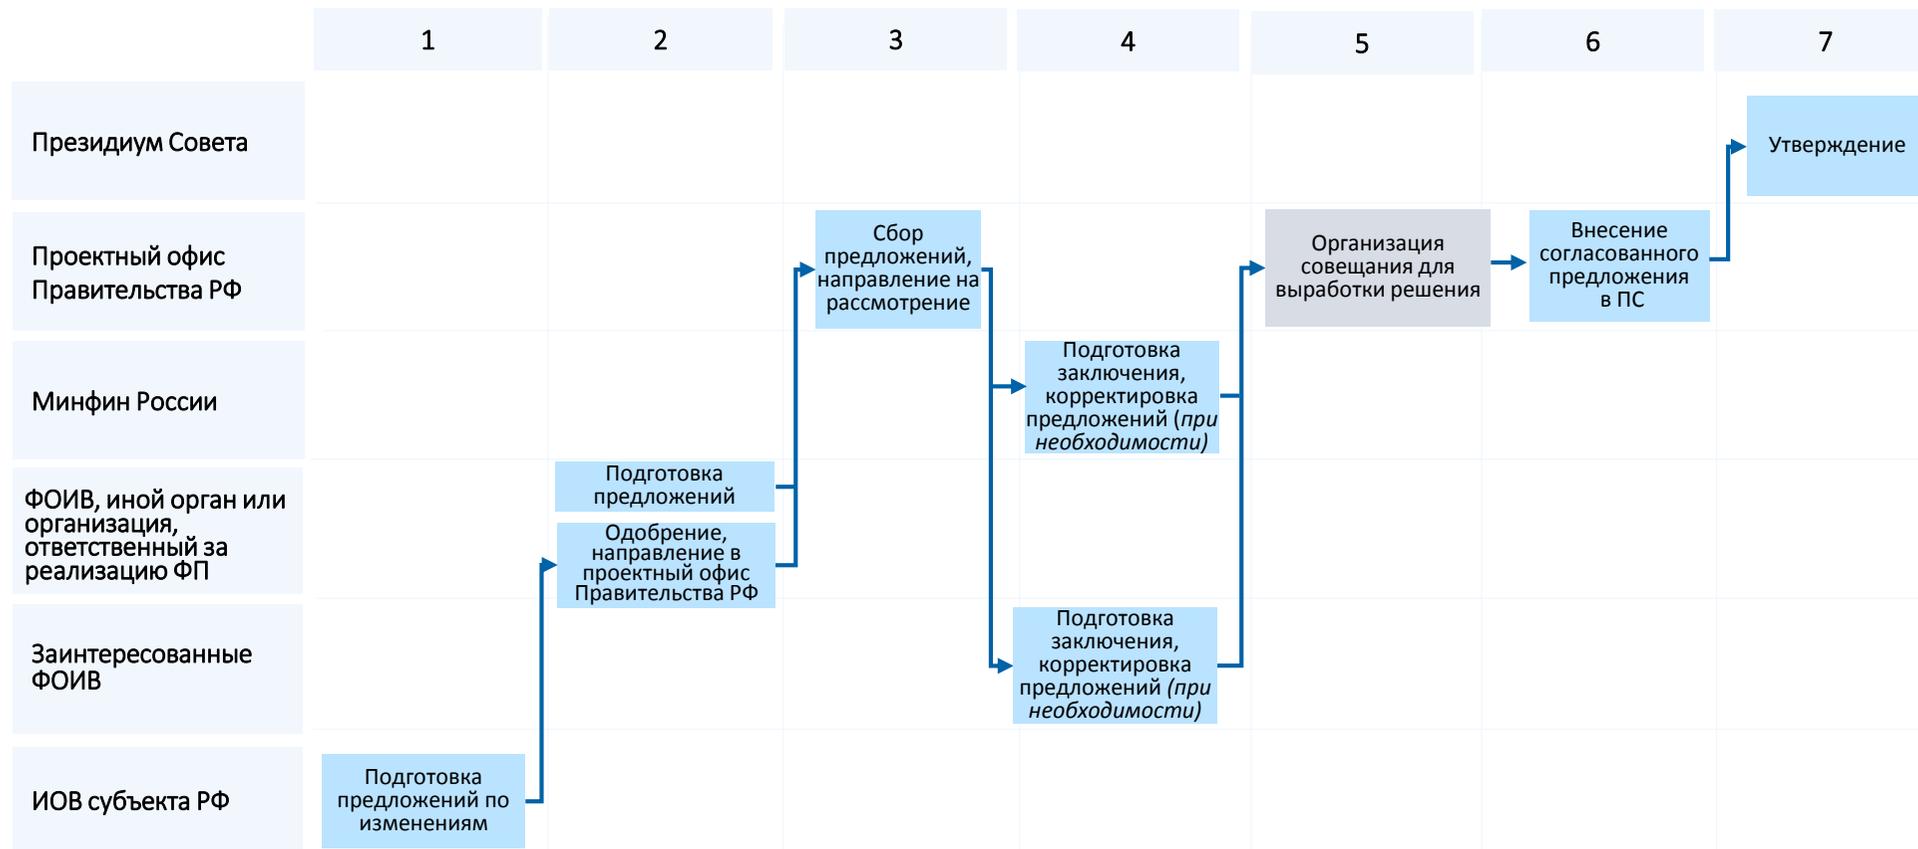

абз. 3 п.4 раздела 2 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

Предложения по дополнению перечня результатов новым типом без одновременного внесения предложений по внесению изменений в перечень стандартизированных контрольных точек в части дополнения специальными контрольными точками для данного типа результата не допускаются



Особенности применения изменений перечня типов результатов и стандартизированных контрольных точек



п.8 раздела 2 Методических указаний применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

Изменения перечня типов результатов

Дополнение нового типа результата

- используется только для **вновь включаемых** результатов в федеральный проект

Исключение типа результата

- используется в уже реализуемом результате до истечения срока его реализации
- не применяется для вновь включаемых результатов

Изменение наименования типа результата

- используется со дня, следующего за днем утверждения президиумом Совета



п.9 раздела 2 Методических указаний применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

Изменения перечня стандартизированных контрольных точек

Дополнение контрольной точки

- используется для **вновь включаемых** результатов
- включается в планы мероприятий в течение **10 р.д.** со дня оповещения об изменениях всех участников реализации результата

Исключение контрольной точки

- контрольные точки в планах мероприятий **определяются как дополнительные** по истечении **10 р.д.** со дня утверждения изменений

Изменение наименования контрольной точки

- используется со дня, следующего за днем утверждения президиумом Совета

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- Для **завершенных** результатов
- Для **достигнутых** контрольных точек



п.10 раздела 2 Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов

- ! **Внесение изменений** в федеральные проекты, связанных с изменениями, внесенными в перечень типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, а также с изменениями ранее выбранных типов результатов по результатам федеральных проектов, **осуществляется в установленном порядке (запросы на изменения)**



Пример плана мероприятий

Иллюстративно

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов) – 1 ед	31.12.2019		И.И. Иванов	В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации: - к 2019г будет реконструирована 1 детская больница (корпус) , получено разрешение на ввод в эксплуатацию.	ПС
1.1.	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов (на реконструкцию 1 детской больницы в 1 субъекте РФ)	01.02.2019		П.П. Петров	Утверждено Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов на строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов)	ПК
1.2.	...					
1.3.	Земельный участок предоставлен заказчику				применяется только для вида работ "строительство"	ПК
2.	Новое строительство/реконструкция детских больниц (корпусов) – 5 ед	01.01.2019	31.12.2020	А.А. Попов	В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации: - к 31.12.2020 г. будет построено/ реконструировано (нарастающим итогом) 5 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод в эксплуатацию	ПС
2.1	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) (4 субъектам РФ на строительство 3 больниц и реконструкцию 1 больницы, вводимых в эксплуатацию в 2020 году)	01.02.2020		И.А. Сидоров	Утверждены локальные акты субъекта РФ о распределении межбюджетных трансфертов по субъектам РФ (муниципальным образованиям)	ПК
2.2	
2.3	Получено разрешение на строительство (2 субъекта РФ на строительство 2 больниц, вводимых в эксплуатацию в 2020 году)	15.06.2019		А.А. Кузнецов	Предоставлены разрешения на строительство 2 детских больниц вместимостью 2000 койкомест	ПК
2.4	Получено разрешение на строительство (1 субъект РФ строительство 1 больницы, вводимой в эксплуатацию в 2020 году)	15.07.2019		А.А. Кузнецов	Предоставлены лицензионно-разрешительные документы на строительство детской больницы	ПК
2.5	Получено разрешение на реконструкцию (1 субъект РФ на реконструкцию 1 детской больницы в 2020 году)	15.01.2020		А.А. Кузнецов	Предоставлены лицензионно-разрешительные документы на реконструкцию детской больницы	ПК
2.6	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (для 1 детской больницы в 1 субъекте РФ)	20.12.2020		В.В. Смирнов	Акт ввода в эксплуатацию объекта	ПК

Контрольная точка выполнена

Контрольная точка не требуется

Пример обеспечивающей контрольной точки

Указание дополнительной отраслевой или иной содержательной информации

Дублирование специальной контрольной точки (выделение этапов)

Часто задаваемые вопросы

№	Наименование	Ответ
1	Если результат комплексный (попадает под несколько типов результатов)	<p>В процессе разработки и согласования паспортов национальных и федеральных проектов совместно с Минфином России была проведена работа по привязке результатов проектов к направлениям и видам расходов.</p> <p>Выбор типа результата необходимо осуществлять исходя из того, на что направлено финансирование</p>
2	Если контрольная точка не требуется	В этом случае необходимо указать признак, что контрольная точка не требуется с обоснованием в виде комментария
4	Если контрольная точка выполнена в прошлом	По данной контрольной точке необходимо указать, что она выполнена, установить фактический срок ее реализации и подтверждение достижения контрольной точки
5	Необходимо ли планировать контрольные точки по результатам, которые достигаются в очередной и последующие года	Да. В случае если работы по достижению результата, необходимо начинать уже в текущем году. Например для стройки, нужно уже в текущем году начинать разработку рабочей документации
6	Как планировать контрольные точки, достижение которых осуществляется в нескольких субъектах РФ	В этом случае возможно указание контрольной точки федерального проекта самой поздней плановой даты достижения соответствующих контрольных точек в субъектах РФ или возможно дублирование контрольной точки с указанием достижения соответствующих контрольных точек в ряде субъектов РФ
