



ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА



# Подход к применению типовых результатов



Декабрь 2018

# Основания разработки типовых результатов

## Проблематика:


- 1 Недостаточная детальность планирования
- 2 Часть контрольных точек не связаны с получением результата
- 3 Отсутствие механизма объективной проверки качества плана, уход от «прозрачности»

## Следствия:

- Нереалистичность сроков достижения результатов
- Неполучение заявленных результатов и выгод
- Позднее выявление отклонений, необходимость вносить запросы на изменения

## ЦЕЛЬ:

Обеспечение качественного планирования федеральных и региональных проектов



## Аудитория:

Руководители проектов  
Администраторы проектов  
Участники проектов

## Выгоды:

- Упрощение детального планирования
- Получение заявленных результатов и выгод


**Типовой результат** - Обобщенный результат, не содержащий специфики проекта

# Структура типовых результатов проекта

(пример)



# Примеры структуры типовых результатов

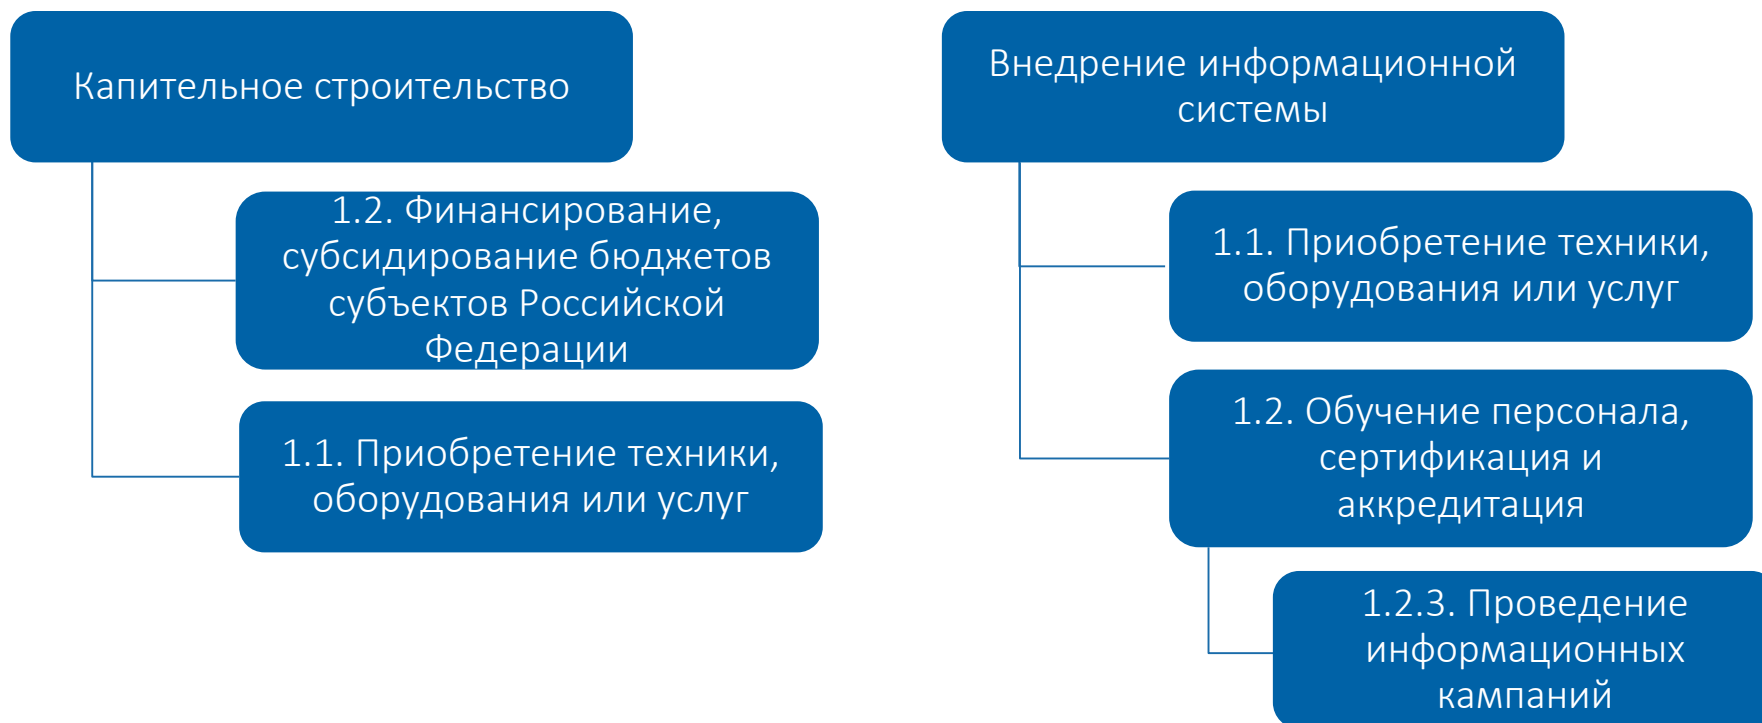

# Перечень типовых результатов

## Типовые результаты (14)

Капитальное строительство

Проведение массовых мероприятий, чемпионатов

Разработка стратегии, планов

Принятие нормативно-правового акта

Приобретение техники, оборудования или услуг

Внедрение услуги для государственных организаций, бизнеса или населения

Разработка методики, стандарт

Проведение информационных кампаний

Финансирование, субсидирование бюджетов субъектов Российской Федерации

Создание новой организации

Внедрение информационной системы

Проведение благоустройства, текущие ремонты

Обучение персонала, сертификация и аккредитация

Организация работ

Перечень типовых результатов не является исчерпывающим.  
Наименования могут быть скорректированы с учетом отраслевой специфики проекта

# Содержание таблиц типовых результатов

1 Общее описание и характеристика типового результата для поиска соответствия результата проекта типовому результату

## 1. Типовой результат "Капитальное строительство"

Общее описание типового результата	Характеристика результата
Проектирование и строительство помещений и зданий (жилье, школы, центры культурного развития, общежития и т.д.), недвижимых сооружений (дороги, линии связи, пункты пропуска и т.д.), капитальный ремонт, реконструкция, реновация	Общее описание объекта: назначение, оснащение, количество и тип объектов, площадь, этажность, расположение, плановая мощность (количество пользователей)

2 Пример наименования результата федерального проекта и его характеристики

## 1.1. Пример результата федерального проекта и его характеристики

Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек (нарастающим итогом)	Драйверами Федерального проекта "Культурная среда" станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В результате реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 5 млн. человек.

3 Пример заполнения плана мероприятий проекта

## 1.2. Пример плана мероприятий по реализации типового результата "Капитальное строительство"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>Построено XX центров культурного развития (результат федерального проекта)</b>				Описание объекта: количество и тип объектов, площадь, этажность, расположение, количество пользователей	ПС
	Определение вида объекта строительства и условий выбора зоны размещения участка под строительство				Определен класс опасности, этажность, вид разрешенного использования, размер участка	
1.1.	Исполнение постановки участка на кадастровый учет				Земельный участок поставлен на кадастровый учет	ПК
	Получение выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество				Получена выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество	
1.1.	Подача заявления в органы с заявлением о предоставлении земельного участка (мероприятие)				Заявление о предоставлении земельного участка с отметкой о получении такого заявления уполномоченным органом	ПК
	<b>Заключено соглашение с собственником земли</b>				Заключенное с собственником земли соглашение,	

Примеры не являются исчерпывающими и не содержат все необходимые и достаточные мероприятия и контрольные точки, требуемые для реализации проекта

Наименования, перечень и последовательность мероприятий и контрольных точек, сроки реализации, вид документа и характеристики результатов могут быть скорректированы с учетом отраслевой специфики проекта
